



REWITALIZACJA GMINY STRZEGOM



WFE.0640.1.2019.MF

Sprawozdanie monitoringowe postępu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025

Stan na dzień 31.12.2018r.

Zatwierdzam, 26.06.2019r.

z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza

mgr inż. Wiesław Witkowski

Strzegom, czerwiec 2019

Obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 (zwany dalej Programem lub LPR) został przyjęty uchwałą nr 103/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.

Treść Programu przewiduje m.in. mechanizm monitorowania postępów jego realizacji w formie sprawozdania monitorującego, sporządzanego przez Burmistrza Strzegomia, opiniowanego następnie przez Zespół ds. Rewitalizacji i przedkładanego Radzie Miejskiej w Strzegomiu.

Po zakończeniu 2018 roku przystąpiono do gromadzenia danych w zakresie postępu realizacji poszczególnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Programie. Pozyskane dane zestawiono w formie tabelarycznej. Na podstawie analizy zgromadzonych danych dokonano kategoryzacji projektów w zależności od stanu ich zaawansowania oraz wystąpienia ewentualnych zagrożeń ich realizacji. Projekty podzielono na 5 kategorii, którym przyporządkowano n.w. kolory:






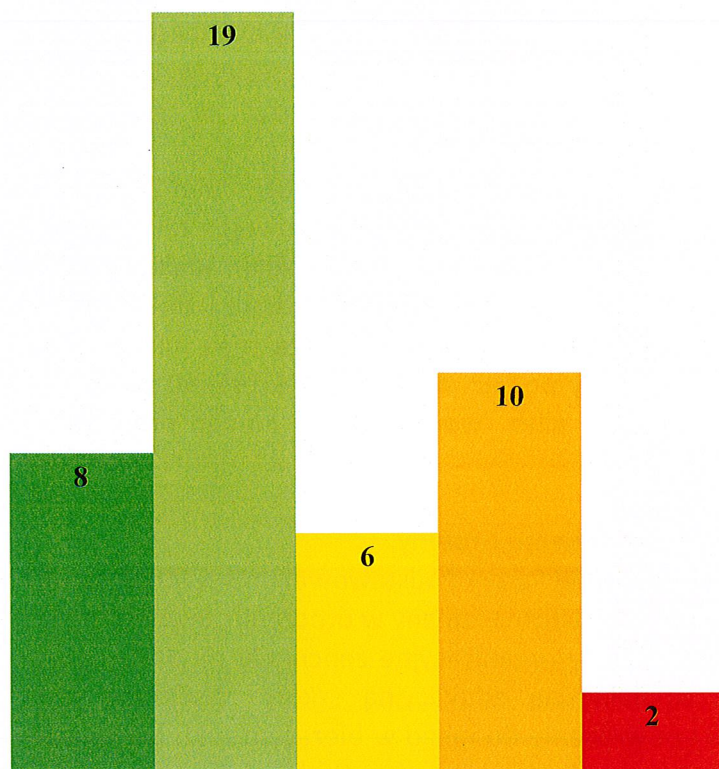
Kolor	Opis kategorii projektów
	Projekty zrealizowane
	Projekty w trakcie realizacji
	Projekty, których termin realizacji nie upłynął i nie zidentyfikowano ryzyka ich niezrealizowania
	Projekty niezrealizowane, pomimo upływu terminu ich realizacji, obarczone możliwym do przewyżnienia ryzykiem ich niezrealizowania w przyszłości
	Projekty niezrealizowane w założonych terminach, których realizacja w przyszłości jest zagrożona

Tabela stanowiąca integralną część sprawozdania monitoringowego zawiera podstawowe dane na temat stopnia realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, w tym zwięzły opis stanu zaawansowania każdego projektu. W przypadku projektów niecyklicznych zakończonych dodatkowo wskazano wartość poniesionych wydatków oraz osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu (tam gdzie było możliwe ich oszacowanie na dzień 31.12.2018r.). W przypadku projektów cyklicznych uwzględniono narastające wartości wydatków na zakończone etapy projektu oraz dotychczas narastająco osiągnięte wskaźniki. Poszczególne projekty oznaczono kolorami adekwatnie do stanu ich zaawansowania.

W odniesieniu do projektów problemowych dodatkowo uwzględniono zwięzły opis przyczyn opóźnień i zidentyfikowanych ryzyk, a także podjęte lub planowane do podjęcia działania zaradcze.

Poniżej przedstawiono uproszczoną grafikę obrazującą liczbę projektów w poszczególnych kategoriach postępu ich realizacji. Zrealizowane bądź w trakcie realizacji jest 27 projektów (60%), natomiast projektów niezrealizowanych bądź takich, których realizacja została uznana za zagrożoną jest 12 (27%). 6 projektów (13%) oczekuje na realizację i nie zidentyfikowano ryzyk ich wykonania w terminie.



Istotnym jest fakt, że spośród pięciu projektów umieszczonych na liście podstawowej projektów rewitalizacyjnych jeden został już zakończony, a trzy kolejne zostaną zakończone w 2019 roku. Tylko jeden z projektów, tj. **A01. Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych**, w znacznym stopniu z przyczyn nie zależnych od Gminy Strzegom odpowiedzialnej za jego realizację, nie został dotychczas zrealizowany. Podjęte jednakże zostały działania dostosowawcze, tak by zmiana zasad finansowania inwestycji drogowych nie przeszkodziła w realizacji projektu. Gmina podjęła działania w celu przedłużenia ważności pozwolenia na budowę, a ponadto poszukuje alternatywnych źródeł finansowania i rozważa realizację projektu etapami.

Szczególnej analizy wymaga 12 projektów, których nie zrealizowano, bądź istnieje znaczne ryzyko ich niezrealizowania w przyszłości. W przypadku 10 projektów oznaczonych kolorem pomarańczowym, w tabeli obrazującej postęp realizacji projektów w kolumnie uwagi zawarto opis podjętych bądź planowanych do podjęcia działań zapobiegawczych, które w szczególności umożliwią realizację projektów w kolejnych latach obowiązywania programu rewitalizacji.

Dwa pozostałe projekty (wymienione poniżej) zostały oznaczone kolorem czerwonym, co oznacza, że ich realizacja jest zagrożona lub niemożliwa.

Projekt B07. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu.

W 2016 nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki przeznaczonych na sportową infrastrukturę przyszkolną. Z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty, nastąpiła zmiana lokalizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, której siedziba została przeniesiona z ul. Jeleniogórskiej na ul. Brzegową. Kosztowna inwestycja na ul. Jeleniogórskiej w znacznym stopniu straciła uzasadnienie, ponieważ w założeniach miała służyć w godzinach przedpołudniowych uczniom PSP jako baza zajęć WF.

Konieczne jest rozważenie, czy istniejąca na terenie Grabiny i w jej bezpośrednim otoczeniu infrastruktura sportowo-rekreacyjna (kompleks sportowy przy ul. Brzegowej), a także nowo powstające place zabaw (w rejonie skrzyżowania ulic Dolnej, Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej i na terenie pozostałego po PSP 3 budynku, przekształcanego na przedszkole i żłobek) oraz budowany park kalisteniczny – zaspokoją potrzeby społeczności w zakresie aktywności fizycznej. Dopiero na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję o wykreśleniu projektu, modyfikacji jego zakresu bądź terminu realizacji, albo wprowadzeniu innego projektu o podobnym charakterze.

Projekt B13. Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny.

Projekt został zgłoszony przez społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, nie został zrealizowany również z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty. Istotne zmiany organizacyjne zepchnęły na dalszy plan działania niezwiązane bezpośrednio z działalnością edukacyjną szkoły. Wskazane jest ponowne rozważenie koncepcji projektu i powrót do niego w bieżącym roku lub latach kolejnych lub zachęcenie innej grupy aktywnych mieszkańców Grabiny do utworzenia stowarzyszenia.

Mając na uwadze powyższe, w obydwu przypadkach przedwczesnym wydaje się być podejmowanie decyzji o ich wykreśleniu z listy projektów rewitalizacyjnych.

Odnotowano przekroczenia pierwotnie zaplanowanych terminów realizacji części projektów, które nie są efektem zaniedbań, a raczej wynikają z przyczyn niezależnych od realizatorów projektów, np. zmiany terminów ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie i ich późnego rozstrzygnięcia, zmiany w otoczeniu prawnym i organizacyjnym, czy też konieczność uwzględniania potrzeb mieszkańców i uwarunkowań nieznanymi w okresie tworzenia Programu. Z wyłączeniem dwóch projektów oznaczonych kolorem czerwonym (opisanych powyżej), należy oczekiwać, że wszystkie pozostałe projekty zostaną zrealizowane w okresie obowiązywania Programu. W chwili obecnej nie jest zasadnym dokonywanie zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów, ponieważ w krótkim okresie mogą być one elementem motywującym do sprawnego podjęcia działań w celu realizacji projektu.

Uwzględniając zgromadzone dane o stanie zaawansowania projektów dokonano analizy wskaźników monitoringowych dla poszczególnych celów Programu. Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki, dla których odnotowano na dzień 31.12.2018r. oczekiwany trend (wzrost).

Wskaźnik	Oczekiwana zmiana
Cel 1. Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz stanu środowiska naturalnego	
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	wzrost
Liczba zabytków poddanych renowacji [szt.]	wzrost
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji [szt.]	wzrost
Powierzchnia zrewitalizowanych i zagospodarowanych terenów zielonych [ha]	wzrost
Cel 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców i integracja społeczności lokalnej	
Liczba oddanych do użytku obiektów sportowo-rekreacyjnych [szt.]	wzrost
Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp.[szt.]	wzrost
Liczba zainstalowanych kamer [szt.]	wzrost
Liczba wyposażonych obiektów publicznych [szt.]	wzrost
Liczba nowo wybudowanych budynków służących integracji i działalności kulturalnej i społecznej [szt.]	wzrost
Liczba utworzonych mieszkań socjalnych [szt.]	wzrost
Liczba nowo utworzonych organizacji pozarządowych [szt.]	wzrost
Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp.	wzrost
Cel 3. Rozwój gospodarczy i poprawa dostępności komunikacyjnej	
Długość przebudowanych dróg gminnych [km]	wzrost
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej [m kw.]	wzrost
Długość utworzonych dróg rowerowych [km]	wzrost
Liczba słupów oświetleniowych [szt.]	wzrost
Liczba spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców	wzrost

Stopień realizacji wskaźników jest zależny od stopnia zaawansowania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przy ocenie trendu uwzględniono wskaźniki zrealizowane w ramach zakończonych projektów niecyklicznych oraz w ramach zakończonych etapów i edycji projektów cyklicznych i realizowanych etapami.

Ocena stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych projektów pozwala stwierdzić, że osiągnięcie wzrostowego trendu pozostałych wskaźników monitoringowych jest możliwe do osiągnięcia w okresie obowiązywania programu.

Ocena stopnia realizacji Programu

Na podstawie analizy zgromadzonych danych o stanie zaawansowania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy stwierdzić, że Program jest realizowany w sposób prawidłowy z nieznacznymi odchyleniami od pierwotnie zaplanowanych terminów. Zrealizowano bądź rozpoczęto realizację 60% projektów, a jedynie w odniesieniu do 2 spośród 45 projektów zidentyfikowano poważne ryzyko ich niewykonania.

Rekomendacje:

1. Brak konieczności ponowienia w 2019 roku naboru projektów rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do Programu.

Uzasadnienie:

Projekty zaplanowane pierwotnie realizują zaplanowane cele rewitalizacji. Dla każdego celu odnotowano oczekiwany wzrost co najmniej połowy przypisanych im wskaźników monitoringowych. Obecnie należy skupić się na skutecznej realizacji pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

2. Brak konieczności wykreślenia w 2019 roku projektów rewitalizacyjnych umieszczonych w LPR.

Uzasadnienie:

Przyczyną wykreślenia projektu może być co prawda opóźnienie terminu realizacji, wystąpienie istotnych zagrożeń realizacji czy też zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu, jednakże wykreślanie projektów w 2019 roku jest przedwcześnie. Należy zintensyfikować działania odnośnie projektów, których realizacja jest opóźniona w stosunku do pierwotnie planowanych terminów oraz dokonać analizy 2 projektów, dla których zidentyfikowano ryzyko ich niewykonania.

Odnośnie projektu **B07. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu** konieczne jest rozważenie w 2019 roku, czy istniejąca na terenie Grabiny i w jej bezpośrednim otoczeniu infrastruktura sportowo-rekreacyjna (kompleks sportowy przy ul. Brzegowej), a także nowo powstające place zabaw (w rejonie skrzyżowania ulic Dolnej, Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej i na terenie pozostałego po PSP 3 budynku, przekształcanego na przedszkole i żłobek) oraz budowany park kalisteniczny – zaspokoją potrzeby społeczności w zakresie aktywności fizycznej. Dopiero na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję o wykreśleniu, modyfikacji bądź wprowadzeniu innego projektu.

Odnośnie projektu **B13. Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny**, należy w porozumieniu z jego wnioskodawcą ponownie rozważyć jego koncepcję i powrócić do niego w bieżącym roku lub latach kolejnych, bądź zachęcić inną grupę aktywnych mieszkańców Grabiny do utworzenia stowarzyszenia.

Sprawozdanie przygotował:

Zastępca Naczelnika
Wydziału Funduszy Europejskich

mgr Marek Flakowski

Zespół ds. Rewitalizacji na posiedzeniu dnia 25.06.2019r. zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń „Sprawozdanie monitoringowe postępu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025. Stan na dzień 31.12.2018r.”.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Funduszy Europejskich

mgr Marek Flakowski

(podpis osoby prowadzącej posiedzenie Zespołu)

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH ZAWARTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI GMINY STRZEGOM NA LATA 2015-2025

Stan na dzień 31.12.2018r.

A. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – lista podstawowa (A)

Lp.	Nazwa projektu	Podmiot Realizujący	Podobszar rewitalizacji	Szacowana wartość PLN	Termin realizacji	Zwięzły opis stanu zaawansowania na dzień 31.12.2018r.	Wskaźnik produktu szacowany/zrealizowany	Wskaźnik rezultatu szacowany/zrealizowany	Całkowite wydatki projektu zakończonego PLN	Uwagi, w tym istotne zmiany mogące naruszać pierwotny cel projektu, uzasadnienie nieosiągnięcia wskaźników
A01	Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszków w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych	Gmina Strzegom	Jaroszków	1 000 000,00	2018	Projekt gotowy do rozpoczęcia robót budowlanych. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego. Decyzja pozwolenia na budowę ważne do dnia 28.09.2019r. (podjęte zostaną działania mające na celu przedłużenie ważności)	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,3 / - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,4 / -	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/-	Nie dotyczy	Z uwagi na zmiany zasad dofinansowania inwestycji drogowych trudno pozyskać dofinansowanie dla projektu, ponieważ nie spełnia on wyśrubowanych wymagań technicznych określonych w regulaminach konkursu (zbyt wąski pas drogowy, sąsiedztwo obiektu zabytkowego). Rozważane jest etapowanie działań inwestycyjnych i poszukiwanie źródeł finansowania innych niż drogowe. W tym celu podjęte zostaną działania zmierzające do przedłużenia ważności posiadanego pozwolenia na budowę.
A02	Zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ul. Dolnej wraz z dojściem do parku miejskiego	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	1 000 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej [m2] 820 / 1487,47 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,9/ 0,91	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/ 1	3 219 141,02	Projekt zakończony
A03	Zagospodarowanie parku miejskiego od ul. Dolnej do ul. Świdnickiej	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	500 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia VI/VII 2019	Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] 0,18 / - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,65/ -	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/-	Nie dotyczy	Projekt w trakcie realizacji
A04	Zagospodarowanie parku miejskiego i terenów przyległych od ul. Świdnickiej do ul. Kasztelańskiej.	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	3 000 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia VI/VII 2019	Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] 0,28/ - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,9/ -	Liczba przestrzeni publicznych o podniesionej estetyce [szt.] 1/-	Nie dotyczy	Projekt w trakcie realizacji
A05	Renowacja zabytkowych murów obronnych w rejonie parku od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej.	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	450 000,00	2018	Uwzględniono jako jeden z etapów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia VI/VII 2019	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1/ -	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1/-	Nie dotyczy	Projekt w trakcie realizacji

B. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – lista uzupełniająca (B)

Lp.	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Pod-obszar rewitalizacji	Planowany termin realizacji	Zwięzły opis stanu zaawansowania na dzień 31.12.2018r.	Wskaźnik produktu szacowany/zrealizowany	Wskaźnik rezultatu szacowany/zrealizowany	Całkowite wydatki projektu zakończonego PLN	Uwagi, w tym istotne zmiany mogące naruszać pierwotny cel projektu, uzasadnienie nieosiągnięcia wskaźników
B01.	Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brzegowej	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2020	Trwają prace nad „Projektem organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Strzegom”, który ma na celu połączenie istniejących i mających powstać wkrótce ścieżek rowerowych w funkcjonalną całość. Dokument ten nie jest elementem projektu rewitalizacyjnego, jednakże stwarza podstawę do działań ujętych w tym projekcie w kolejnych latach.	Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] 0,7 km / -	Liczba osób korzystających z drogi rowerowej [os./rok] 500 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B02.	Przebudowa ulicy Krótkiej i ulicy Parkowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	Projekt gotowy do rozpoczęcia robót budowlanych. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego. Pozwolenie na budowę w zakresie działek innych niż kolejowa ważne do dnia 3.03.2019r. (podjęte zostaną działania mające na celu przedłużenie ważności)	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,6 / - Liczba słupów oświetleniowych [szt.] 7 / -	Nośność drogi Kn/os 80 / -	Nie dotyczy	Z uwagi na zmiany zasad dofinansowania inwestycji drogowych trudno pozyskać dofinansowanie dla projektu, ponieważ nie spełnia on wyśrubowanych wymagań technicznych określonych w regulaminach konkursu (zbyt wąski pas drogowy, sąsiedztwo obiektu zabytkowego. Rozważane jest etapowanie działań inwestycyjnych i poszukiwanie źródeł finansowania innych niż drogowe. W tym celu podjęte zostaną działania zmierzające do przedłużenia ważności posiadanego pozwolenia na budowę.
B03.	Przebudowa chodników i oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 374 w Strzegomiu w ciągu ul Kasztelańskiej	Gmina Strzegom, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2016	Projekt zakończony. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano między innymi chodniki z kostki betonowej, zjazdy z kostki kamiennej i betonowej, obrzeża betonowe oraz krawężniki. Wykonano również energooszczędne oświetlenie LED (stupa+wysięgnik+oprawa)	Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej [m2] 2424 / 2 124,45 Liczba słupów oświetleniowych [szt.] 17 / 17	Nośność drogi Kn/os 115 / 80	577 706,84	Projekt zakończony Wystąpiły nieznaczne różnice wskaźników osiągniętych w porównaniu z zaplanowanymi. Nie miały one jednak wpływu na osiągnięcie celu projektu.
B04.	Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2016 etap I 2018 etap II	Zakończony I etap projektu. W ramach zrealizowanego etapu I wykonany został chodnik i schody z kostki granitowej wraz z obrzeżami.	Powierzchnia nawierzchni z kostki kamiennej [m2] 12 / 57,90 Liczba słupów oświetleniowych [szt.] 5 / -	Zwiększenie dostępności do obiektów publicznych [szt.] 1 / 1	Nie dotyczy	Zrealizowano etap I, nie przewidziano w projekcie budżetu na 2019 rok środków finansowych na realizację etapu II. Tymczasowo wstrzymano dokończenie inwestycji z uwagi na konieczność ulokowania w jej rejonie boksów śmieciowych dla okolicznych budynków mieszkalnych oraz zapewnienia dojazdu pojazdu odbierającego odpady.
B05.	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Strzegomiu wraz z terenem przyległym	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2017	Wymagana jest aktualizacja dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie prac możliwe będzie po jej wykonaniu. W I kwartale planuje się wyłonić wykonawcę aktualizacji.	Powierzchnia nawierzchni z kostki kamiennej [m2] 585 / -	Nośność drogi Kn/os 80 / -	Nie dotyczy	Po zaktualizowaniu dokumentacji możliwa będzie realizacja inwestycji.

B06.	Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2016	Projekt zrealizowany . W ramach projektu zamontowane zostały 4 komplety szybkoobrotowych kamer oraz stanowisko stacyjne. Kamery zamontowano na skrzyżowaniu ulic: Rynek – Paderewskiego Rynek – Kościuszki Rynek – Świdnicka Plac zabaw przy ul. Czerwonego Krzyża	Liczba zainstalowanych kamer [szt.] 3/ 4	Spadek rocznej liczby przestępstw w obszarze rewitalizowanym [%] 10/ będzie badany w okresie późniejszym	149 282,70	Projekt zakończony
B07.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	Wnioskowano o dofinansowanie projektu ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w 2016 roku. Projekt został pozytywnie oceniony, nie uzyskał jednak dofinansowania. Dokumentacja techniczna utraciła ważność w 2018 roku.	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowo-rekreacyjnych [szt.] 1/ 0	Liczba beneficjentów [os.] 100/ 0	Nie dotyczy	W 2016 nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków MSiT przeznaczonych na sportową infrastrukturę przyszłą. Z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty, nastąpiła zmiana lokalizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, której siedziba została przeniesiona z ul. Jeleniogórskiej na ul. Brzegową. Kosztowna inwestycja na ul. Jeleniogórskiej straciła sens, ponieważ w założeniach miała służyć w godzinach przedpołudniowych uczniom PSP jako baza zajęć WF. Konieczne jest rozważenie, czy istniejąca na terenie Grabiny i w jej bezpośrednim otoczeniu infrastruktura sportowo-rekreacyjna (kompleks sportowy przy ul. Brzegowej), a także nowo powstające place zabaw (w rejonie skrzyżowania ulic Dolnej, Jeleniogórskiej i Wałbrzyskiej i na terenie pozostałego po PSP 3 budynku, przekształcanego na przedszkole i żłobek) oraz budowany park kalisteniczny – zaspokoją potrzeby społeczności w zakresie aktywności fizycznej.
B08.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	Uwzględniono jako jeden z elementów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Liczba obiektów poddanych termomodernizacji [szt.] 1/ 1	Oszczędność energii końcowej na cele grzewcze oraz przygotowania c.w.u GJ/rok 2730 / 2731,68	1 512 314,05	Projekt zakończony
B09.	Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	Nie zrealizowano dotychczas kompleksowej przebudowy ulicy. W celu poprawy dostępności i komfortu użytkowników wykonano nawierzchnię szutrową. W związku z planowanym uruchomieniem „Funduszu Dróg Samorządowych” przewiduje się zlecenie wykonania dokumentacji technicznej.	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,4 / -	Nośność drogi Kn/os 80/ -	Nie dotyczy	Pomimo upływu terminu realizacji nadal istnieje możliwość wykonania przebudowy drogi, z uwagi na nowe możliwości finansowania jakie ma zapewnić planowany do uruchomienia w 2019 roku rządowy program „Fundusz Dróg Samorządowych”

B10.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2018	Brak budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej ze względu na brak ujęcia inwestycji w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodno Kanalizacyjnych Spółki WIK. W związku z pojawieniem się możliwości finansowania przebudowy dróg gminnych z planowanego do uruchomienia w 2019 roku „Funduszu Dróg Samorządowych” – rozważone zostanie również wykonanie infrastruktury komunalnej pod planowaną drogą.	Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] 0,5 / - Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km] 0,5 / -	Liczba przyłączy [szt.] 10/ -	Nie dotyczy	Pomimo upływu terminu realizacji nadal istnieje możliwość wykonania przebudowy ul. Malinowej, z uwagi na nowe możliwości finansowania jakie ma zapewnić planowany do uruchomienia w 2019 roku rządowy program „Fundusz Dróg Samorządowych”. W przypadku podjęcia przebudowy drogi – kompleksowo zostanie rozwiązany również problem brakującej infrastruktury komunalnej.
B11.	Miejsca mi bliskie – Strzegom, Grabina, Szkoła	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną	06.2017	Zrealizowano w okresie wrzesień 2016-czerwiec 2017 działania, dzięki którym uczniowie poznali historię Strzegomia, dzielnicy Graby i szkoły. Rozbudzili poczucie przynależności do środowiska lokalnego i regionu poprzez odkrywanie walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych z uwzględnieniem rysu demograficznego dzielnicy Graby: 1) konkurs fotograficzny „Moja najbliższa okolica”, 2) gazetka ścienna dotycząca historii i współczesności, 3) konkurs na prezentację multimedialną dot. ciekawych miejsc w najbliższej okolicy i bogactw naturalnych, 4) wywiady z najstarszymi mieszkańcami Grabiny, 5) Warsztaty plastyczno-historyczno-muzealne pt. „Przyszłość mojego miasta”, 6) Opracowanie prezentacji multimedialnej na podstawie kronik szkolnych.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. [szt.] 1 / 6	Liczba beneficjentów [os.] 100/ 100	500,00 zł	Projekt zakończony
B12.	Sportowy Festyn Rodzinny	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną	Projekt cykliczny od 2017 roku	Odbyły się dwie edycje projektu: w roku 2017, 2018. Planowana jest coroczna kontynuacja działań	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. rocznie [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów (rocznie) [os.] 150/ 150	1 500,00 zł rocznie	Realizacja cykliczna bez zaktóceń

B13.	Założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Grabiny	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Strzegomiu	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną	06.2017	Projekt nie został zrealizowany, w związku ze zmianami organizacyjnymi, w tym zmianą lokalizacji PSP nr 3, spowodowanymi wdrożeniem reformy oświaty	Liczba nowo utworzonych organizacji pozarządowych [szt.] 1 / -	Liczba członków stowarzyszenia [os.] 20 / - (założyciele) + mieszkańcy gminy	Nie dotyczy	Projekt został zgłoszony przez społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu. Z uwagi na nagłe i istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tj. wprowadzenie reformy oświaty, nastąpiła zmiana lokalizacji szkoły, której siedziba została przeniesiona z ul. Jeleniogórskiej na ul. Brzegową. Istotne zmiany organizacyjne zepchnęły na dalszy plan działania niezwiązane bezpośrednio z działalnością edukacyjną szkoły. Wskazane jest ponowne rozważenie koncepcji projektu i powrócenie do niego w bieżącym roku lub latach kolejnych lub zachęcenie innej grupy aktywnych mieszkańców Grabiny do utworzenia stowarzyszenia.
B14.	Famijne kino rowerowe pod chmurką	Strzegomskie Centrum Kultury Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Grabiny	Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną	Projekt cykliczny od 2019 roku	Projekt w fazie koncepcji	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. rocznie [szt.] 2 / -	Liczba beneficjentów (rocznie) [os.] 100 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B15.	Turniej Sołectw Strzegom-Jaroszów	Rada Sołectwa Strzegom we współpracy z Radą Sołecką Wsi Jaroszów, Strzegomskim Centrum Kultury, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, radnymi Rady Miejskiej w Strzegomiu	Na przemian: Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną i Jaroszów	Projekt cykliczny od 2017 roku	Odbyły się dwie edycje wydarzenia w 2017 i 2018 rok.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. (rocznie) [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów [os.] 100 / 100	0,00	Realizacja cykliczna bez zakłóceń
B16.	Świetlice opiekuńczo-wychowawcze „Akcja” nowym sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”	Na Na przemian: Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną i Jaroszów	Projekt cykliczny Strzegom od 2017, Jaroszów od 2020	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Grabys” funkcjonowała od 17 stycznia do 31 lipca 2017 r. W dni powszednie tj. od wtorku do piątku (4 dni w tygodniu) po 4 godziny dziennie. Łącznie odbyło się 109 dni z zajęciami świetlicowymi, w których średnio udział brało ok. 20 dzieci. Łączne wydatki ok. 16,5 tys. zł. W 2017 r. i 2018 r. w PSP nr 3 realizowane było zadanie pn. „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w placówkach szkolnych” – prowadzenie tych zajęć kosztowało ok. 2,3 tys. zł. W zakresie zajęć w Jaroszowie – projekt w fazie koncepcji.	Liczba zorganizowanych świetlic [szt.] 2 / 1	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 20-40 / 20	18 800,00	Dotychczas częściowo zrealizowano projekt w zakresie organizacji świetlicy na Grabach. Wskutek reformy oświaty i przeniesienia siedziby szkoły podstawowej na ul. Brzegową - zawieszono działalność świetlicy. Alternatywnie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne w PSP nr 3 organizowane przez inną organizację pozarządową. Projekt w zakresie świetlicy w Jaroszowie obecnie jest w fazie koncepcji, a wdrożenie tego etapu przewiduje się w 2020 roku.

B17.	Poprawa jakości nauczania na każdym etapie edukacji w placówkach oświatowych na obszarach rewitalizacji.	Gmina Strzegom Placówki oświatowe położone na obszarach rewitalizacji. Organizacje pozarządowe wspierające szkoły.	Jaroszów, Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabliną	2016-2023 (realizacja wieloletowa w miarę pojawiania się źródeł dofinansowania)	Dotychczas (IX/2016-VII/2018) zrealizowano Etap I tj. skierowany m.in. do uczniów PSP nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu i w ZSP w Jaroszowie (PSP i Gimnazjum), projekt: „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wydatki: 302 539,13 zł Liczba godzin zajęć: 4980 h lekcyjnych Liczba beneficjentów: 241 uczniów + 5 nauczycieli W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFS projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom. Okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Projektem zostaną objęte m.in. PSP nr 3 i PSP w Jaroszowie	Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych (h/rok) 100 / 2 490	Liczba beneficjentów w okresie rewitalizacji [os.] 500 / będzie badana w późniejszym terminie	302 539,13	Wskaźnik produktu oszacowano dzieląc liczbę godzin przez 2 (przyjmując 2-letni okres realizacji projektu)
B18.	Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95	Gmina Strzegom	Jaroszów	2016	Zrealizowano projekt w 2016 roku (wykonano zaplanowany remont lokalu, a następnie go wyposażono w niezbędne meble i urządzenia). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku	Liczba wyposażonych obiektów publicznych [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów w okresie rewitalizacji [os.] 500/ będzie badany w późniejszym terminie	89 363,34	Projekt zakończony
B19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie	Gmina Strzegom	Jaroszów	2018	Uwzględniono jako jeden z elementów większego projektu, na który uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych.	Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt.] 1 / 1	Oszczędność energii końcowej na cele grzewcze oraz przygotowania c.w.u GJ/rok 718/ 695,4	805 302,70	Nieznaczna różnica w wartości wskaźnika rezultatu wynika z konieczności zastosowania innych technologii niż pierwotnie wskazane w programie funkcjonalno- użytkowym, a wynikających z zaleceń konserwatora zabytków odnośnie technologii docieplenia frontowej ściany budynku. Zmiana wskaźnika nie wpływa negatywnie na osiągnięcie celu projektu.

B20.	Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków	Gmina Strzegom	Jaroszków	2019	Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Projekt wybrany do dofinansowania – przewidywany termin zawarcia umowy o dofinansowanie – II/2019. W XII/2017 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwają roboty budowlane – przewidywany termin zakończenia – IV/2019	Liczba nowo wybudowanych budynków służących integracji i działalności kulturalnej i społecznej [szt.] 1/ -	Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [szt.] 1/ -	Nie dotyczy	Projekt w trakcie realizacji
B21.	Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne – Jaroszków 142 tzw. „Hotele”	Gmina Strzegom	Jaroszków	2019	Pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-20. Zrealizowano zaplanowany zakres robót budowlanych. Odbiór nastąpił dnia 15.10.2018r.	Liczba utworzonych mieszkań socjalnych [szt.] 20 / 21	Liczba osób zamieszkujących odnowione budynki mieszkalne [szt.] 30/ będzie badany w późniejszym terminie	2 563 579,47	Projekt zakończony
B22.	Zagospodarowanie terenu zielonego działki nr 215 w Jaroszkowie na cele rekreacyjno-integracyjne mieszkańców wsi.	Gmina Strzegom	Jaroszków	2020	Opracowano projekt budowlany. Zadanie realizowane etapami dotychczas wykonano parking wraz ze zjazdem z mieszanki mineralnej ograniczony obrzeżami kamiennymi (finansowanie z Funduszu Sołeckiego).	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,3 / -	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 500/ -	Nie dotyczy	Projekt realizowany etapami
B23.	Przebudowa drogi na działkach nr 457/1 i 457/2 w Jaroszkowie	Gmina Strzegom	Jaroszków	2017	Projekt gotowy do rozpoczęcia robót budowlanych. Trwa poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego. Zgłoszenie robót budowlanych ważne do dnia 07.03.2019r. (podjęte zostaną działania mające na celu przedłużenie ważności)	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,4 / ...	Nośność drogi Kn/os 80 / ...	Nie dotyczy	Z uwagi na zmiany zasad dofinansowania inwestycji drogowych trudno pozyskać dofinansowanie dla inwestycji drogowych, ponieważ nie spełnia ona wyśrubowanych wymagań technicznych określonych w regulaminach konkursu (zbyt wąski pas drogowy). Nadal będą poszukiwane źródła finansowania projektu. W tym celu podjęte zostaną działania zmierzające do przedłużenia ważności posiadanego pozwolenia na budowę.
B24.	Przebudowa drogi na działkach nr 447 i 448 w Jaroszkowie	Gmina Strzegom	Jaroszków	2019	Projekt w fazie koncepcji	Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 0,1 / ...	Nośność drogi Kn/os 100/ ...	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B25.	Festyn Świętojański w Jaroszkowie	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Jaroszkowie	Jaroszków	Projekt cykliczny od 2017 roku	Odbyły się 4 edycje festynu (2017, 2018). Orientacyjny koszt 6000 zł (przy wydatnej pracy wolontariuszy). Rokrocznie bierze udział ok. 500 os.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. (rocznie) [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 500/ 500	Ok. 6 000,00 zł rocznie	Realizacja cykliczna bez zakłóceń
B26.	„Festyn Rodzinny Mama, Tata i ja”	Zespół Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum w Jaroszkowie	Jaroszków	projekt cykliczny od 2017 roku	Odbyły się kolejne edycje festynu w latach 2017, 2018	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. rocznie [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów [os.] 500/ 1000	10 292,25	Realizacja cykliczna bez zakłóceń

B27.	Projekt ekologiczny „Młodzi Jaroszwianie dbają o klimat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczny Szkoła Podstawowa w Jarosławie	Jarosłów	Miesiące 09.-10. i 04-06. od 2017r. (projekt cykliczny)	O odbyły się kolejne edycje projektu w latach 2017, 2018	Liczba projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie rewitalizacji [szt.] 7 / 7	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 50/ 50	0,00	Projekt realizowany bezkosztowo
B28.	Jaroszowski Marszbieg Przetajowy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarosławie	Jarosłów	Projekt cykliczny od 2016 roku	O odbyły się kolejne edycje marszbiegu w latach 2016, 2017, 2018	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. Rocznie [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów [os.] 300/ 300	6 837,41	Realizacja cykliczna bez zakłóceń
B29.	Jaroszowskie Graffiti-Murale	„Razem dla Jaroszowa” we współpracy z innymi organizacjami i grupami społecznymi we Jarosławie	Jarosłów	Projekt cykliczny od 2017 roku	Projekt nie został dotychczas rozpoczęty	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. rocznie [szt.] 1 / -	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 10/ -	Nie dotyczy	Konieczna jest ponowna analiza wykonalności projektu i źródeł jego finansowania oraz uzyskanie deklaracji wnioskodawców projektu o woli jego realizacji.
B30.	Kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych we wsi Jarosłów	Rada Sołecka wsi Jarosłów	Jarosłów	Projekt cykliczny od 2017 roku	W 2017 i 2018 roku przekazano do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu informacje o planowanych na kolejny rok kalendarzowy wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i we wsi Jarosłów, które następnie trafiają do ogólnogminnego kalendarza wydarzeń	Liczba opublikowanych kalendarzy wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych rocznie [szt.] 1 / 1	Liczba beneficjentów imprez rocznie [os.] 500/ 500	0,00 zł	Realizacja cykliczna bez zakłóceń i bezkosztowo poprzez przekazywanie danych o terminach i tematyce wydarzeń kulturalnych do Kalendarza Najważniejszych Wydarzeń Gminy Strzegom, publikowanego na stronie internetowej Gminy Strzegom.
B31.	Konkurs w zakresie estetyki budynków, ogrodzeń, zagrod i ogrodów	Rada Sołecka Jaroszowa w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi z terenu wsi	Jarosłów	Projekt cykliczny od 2017 roku	Projekt nie został zrealizowany	Liczba konkursów rocznie [szt.] 1 / -	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 10/ -	Nie dotyczy	Konieczna jest ponowna analiza wykonalności projektu i źródeł jego finansowania oraz uzyskanie deklaracji wnioskodawców projektu o woli jego realizacji.
B32.	Nasadzenie drzew i krzewów w rejonie graniczenia obszaru wsi ze składowiskiem odpadów	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Jarosłów i Rusko we współpracy z innymi organizacjami i grupami społecznymi we wsi oraz właścicielem składowiska odpadów komunalnych	Jarosłów	2017	Projekt zrealizowano w znacznie ograniczonym zakresie i nie miał formy wydarzenia ogólnowieskiego.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych itp. Rocznie [szt.] 1 / -	Liczba beneficjentów rocznie [os.] 30/ -	0,00	Istnieje możliwość jego kontynuacji, ponieważ społeczność wsi ma możliwość pozyskania sadzonek drzew od przedsiębiorcy prowadzącego składowisko odpadów
B33.	Remont elewacji kościoła św. Jana Chrzciciela w Jarosławie	Parafia Rz.kat. św. Jana Chrzciciela w Jarosławie	Jarosłów	2019	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o dotację do MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego. Planowane złożenie wniosku o dotację do Gminy Strzegom	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1 / -	Odnowiony o zabezpieczeniu przed zniszczeniem obiekt [szt.] 1/ -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu

B34.	Remont muru okalającego kościoła św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Parafia Rz. Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2021	W fazie koncepcji	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1 / -	Odnowiony i zabezpieczony przed zniszczeniem obiekt [szt.] 1 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B35.	Remont gotyckiej wieży kościoła św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Parafia Rz. Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2020	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę.	Liczba zabytków poddanych pracom konserwacyjnym [szt.] 1 / -	Liczba osób odwiedzających poddane konserwacji i/lub restauracji obiekty [os./rok.] 500 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B36.	Zagospodarowanie terenu wokół kościoła św. Jana Chrzyciela w Jarosławie na cele integracji społecznej mieszkańców	Parafia Rz. Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2022	Opracowano projekt, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Złożono wniosek w 2017 r. do LGD lecz nie uzyskał wsparcia. Planuje się ponowne złożenie wniosku do LGD w 2019r.	Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej [ha] 0,15 / -	Liczba osób korzystających z wytworzonych/zmodyfikowanych obiektów [os.] 500 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B37.	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych w Jarosławie	Parafia Rz. Kat. św. Jana Chrzyciela w Jarosławie	Jarosław	2022	Opracowano projekt, uzyskano pozwolenia konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Złożono wniosek w 2017 r. do LGD lecz nie uzyskał wsparcia. Planuje się ponowne złożenie wniosku do LGD w 2019r.	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowo-rekreacyjnych [szt.] 3 / -	Liczba osób korzystających z wytworzonych/zmodyfikowanych obiektów sportowych [os.] 200 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B38	Centrum Interwencji Kryzysowej w Jarosławie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu	Jarosław	Od 2020	Projekt w fazie koncepcji	Liczba utworzonych centrów interwencji [szt.] 1 / -	Liczba osób korzystających z usług [os.] 200 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu
B39	Rowerem przez Strzegom	Gmina Strzegom we współpracy z NGO	Strzegom – Stare Miasto i Grabina	2020	Trwają prace nad „Projektem organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Strzegom”, który ma na celu połączenie istniejących i mających powstać wkrótce ścieżek rowerowych w funkcjonalną całość. Dokument ten nie jest elementem projektu rewitalizacyjnego, jednakże stwarza podstawę do działań ujętych w tym projekcie w kolejnych latach.	Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych [szt.] 1 / -	Liczba uczestników [os.] 50 / -	Nie dotyczy	Brak zidentyfikowanych zagrożeń realizacji projektu

B40	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji	Gmina Strzegom	Strzegom – Stare Miasto i Grabina, Jarosłów	Projekt cykliczny od 2016 roku	Począwszy od 2016 roku, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu, firmy doradcze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”) organizowane są szkolenia, warsztaty i konsultacje dla przedsiębiorców i osób chcących podjąć działalność gospodarczą (2016- 2, 2017 – 3, 2018 - 4	Liczba spotkań informacyjnych rocznie [szt.] 1 / 3	Liczba uczestników rocznie [os.] 40 / 40	0,00	Realizacja cykliczna bez zakłóceń. Zadanie realizowane bezkosztowo
-----	--	----------------	---	--------------------------------	---	---	---	------	---
